



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ
TİKİNTİDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ NƏZARƏT DÖVLƏT AGENTLİYİ
TƏSİSATDANKƏNAR DÖVLƏT EKSPERTİZA BAŞ İDARƏSİ**

AZ 1014, Bakı şəhəri, Füzuli küç., 64B
Tel: (994 12) 512-20-90, (994 12) 512-20-85

18 iyun 2026-cı il

№ 3-18-7/2-2174/2026

**Naxçıvan Muxtar Respublikası
Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinə**

Məlumat üçün: **Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət İdarəsinə**

Məlumat üçün: **Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Energetika Xidmətinə**

19.06.2025-ci il tarixli 5-23/2-528/2025 nömrəli məktubunuz ilə təqdim olunmuş "Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, 132/110/35/10 kV-luq "Culfa" yarımstansiyası" üzrə layihə sənədlərinə aid, 12.06.2026-cı il tarixli 42123 nömrəli ekspertiza rəyi hazırlanmışdır.

Rəy İdarəmizdə səlahiyyətli nümayəndəniz tərəfindən əldə edilə bilər.

**Hörmətlə,
Rəis**

Təyyar Hüseynli

Qurumun adı: AR FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi
Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi


İmzalanma tarixi: 18 iyun 2026-cı il

Sənədin nömrəsi: 3-18-7/2-2174/2026

İmzalayan şəxs(lər): Təyyar Hüseynli, idarə rəisi

Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.





Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi

34997

Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi



Təsdiq edirəm:

İdarənin rəisi

T. Hüseynli

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu,
132/110/35/10 kV-luq "Culfa" yarımstansiyası

EKSPERTİZA RƏYİ

№ 42123

12.06.2026


Sifarişçi:

Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət
Energetika Xidməti

Layihəçi:

«IMPULS GROUP» MMC
«Kare Proje Consulting» MMC

BAKİ - 2026



Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi
TƏSİSATDANKƏNAR DÖVLƏT EKSPERTİZA BAŞ İDARƏSİ

EKSPERTİZA RƏYİ

12.06.2026-cı il

№ 42123

Sənədin tipi : Tikinti layihəsi

Tikintinin adı və yerləşdiyi yer : Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu,
132/110/35/10 kV-luq "Culfa" yarımstansiyası

Sifarişçi : Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Energetika Xidməti

Layihəçi : - «İMPULS GROUP» MMC
Lisensiya qeydiyyat № EL-709/2023,
30.08.2023-cü il
- «Kare Proje Consulting» MMC
Lisensiya qeydiyyat № İN/L-432/2018,
09.10.2018-ci il

Layihənin Baş Mühəndisi : S.Qurbanov

Maliyyə mənbəyi : Büdcə

Təqdim edilmiş tikintinin dəyəri : Resurs metodu ilə tərtib olunmuş vekun
smeta üzrə (ƏDV-siz) cəmi [redacted]
manat, o cümlədən TQİ [redacted]
manat

Təqdim olunan sənədlər:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin 19.06.2025-ci il tarixli 5-23/2-528/2025 nömrəli məktubu ilə ekspertiza olunmaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti tərəfindən layihə üzrə aşağıdakı sənədlər təqdim edilmişdir:

- baş plan və memarlıq bölməsi;
- konstruksiya bölməsi;
- konstruktiv hesabat;
- Texniki rəy;
- mühəndisi-geoloji hesabat;
- Mühəndis-Axtarış Mərkəzinin rəyi;
- mühəndisi-kommunikasiya bölmələri;

- tikintinin təşkilı layihəsi;
- smeta sənədləri;
- ızahat yazısı.

Layihələndirmə üçün əsas

- Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti tərəfindən təsdiq edilmiş "Layihə təpşirgi".

Ümumi hissə


Layihədə, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, 132/110/35/10 kV-luq "Culfa" yarımstansiyasının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.

Baş plan

Baxılan ərazi müəkkəb həndəsi formadadır. Tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi Bakı şəhərindən 570 km cənub-qərbdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonu ərazisində yerləşir.

Baş plana əsasən sahədə ümumi idarəetmə mərkəzinin yenidən qurulması, nəzarət-buraxılış məntəqəsi, yeraltı nasosxana, 50.0m³-luq təsərrüfat-icməli yeraltı su anbarının, 2x54.0m³-luq yeraltı yanğın su anbarları, 20m³ və 30m³-luq yağdığıan, dizel generatoru, 2 ədəd 16MVA-lıq, 1 ədəd 50 MVA-lıq transformator və ulantılarn saxlanması üçün meydançalar, 2 ədəd 63 kVA X.S. transformatoru, 110 kV-luq APQ, daxil hasar, xarici daş hasar, dənəvəzə və şambo layihələndirilmişdir.

Ərazidə, həmçinin hasarın tikintisi, xarici işıqlanma, 132 kV-luq APQ-da quraşdırma işləri, kabel xəndəklərinin tikintisi, abadlıq (şaquli planlaşdırma, yaşıllaşdırma) və s. işlər nəzərdə tutulmuşdur.

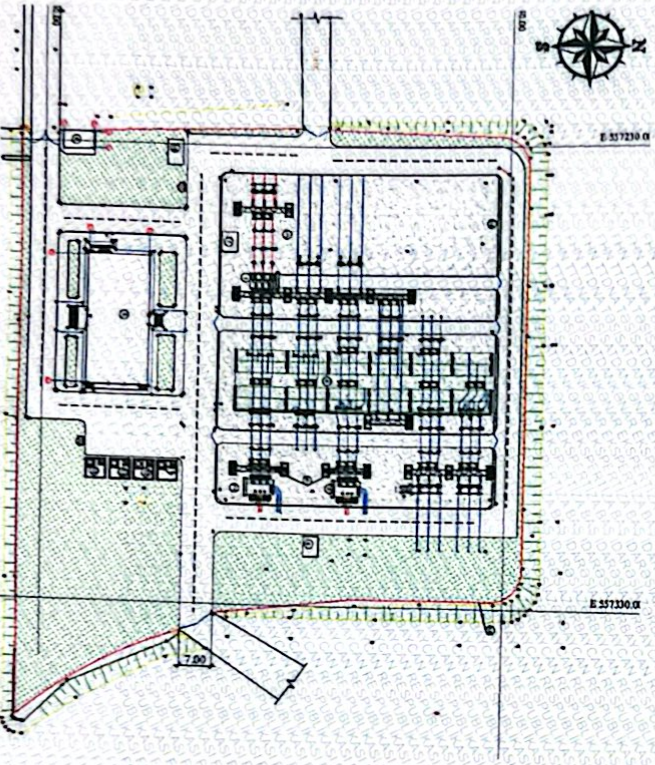

Memarlıq həlli

Ümumi idarəetmə mərkəzi

Planda کنار oxlar arasında ölçüləri 28,00x12,80 m olan bina, kursü + 1 mərtəbəli, düzbucaqlı formada inşa edilmişdir.

Binanın oğadavamlılıq dərəcəsi – II, məsuliyyətlik səviyyəsi – II normal, funksional yanğın təhlükəsi sinfi – Ø5.1 qəbul edilmişdir.


Mərtəbədə təyinatına görə müxtəlif yerləşənlər nəzərdə tutulmuşdur.

Divartar – kursü mərtəbəsində mışarlanmış əhəndaşı, 1-ci mərtəbədə qazobeton bloklarla hürülmüşdür.


Dam örtüyü – ağac konstruksiyalar üzrə profnasillə döşənmışdir.

Fasadlar – əsasən suvaq üzərində fasad boyası ilə boyanmışdır.

Serti ±0,000 səviyyəsi binanın 1-ci mərtəbəsinin döşəməsi qəbul edilmişdir, bu da 102.700 müllaq qiymətinə bərabərdir.

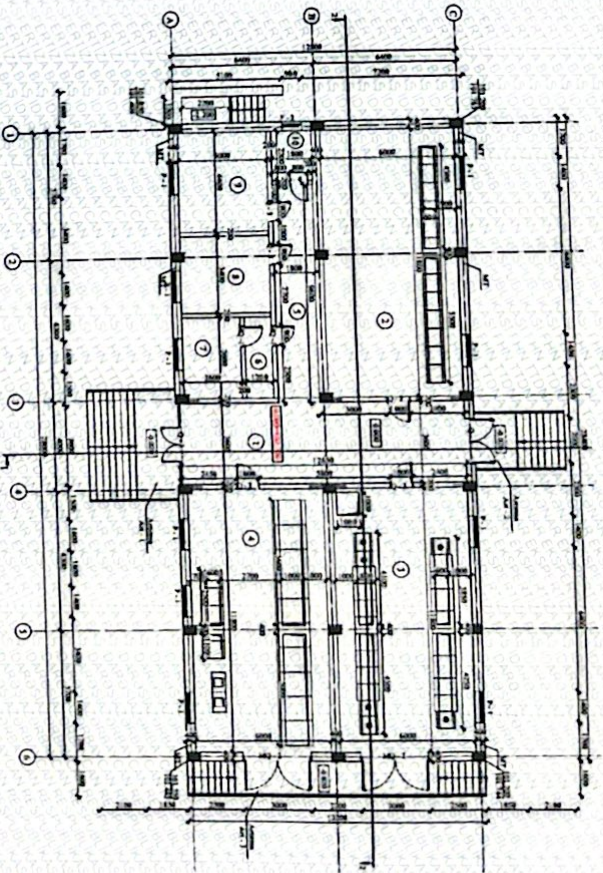

1-ci mərtəbənin planı

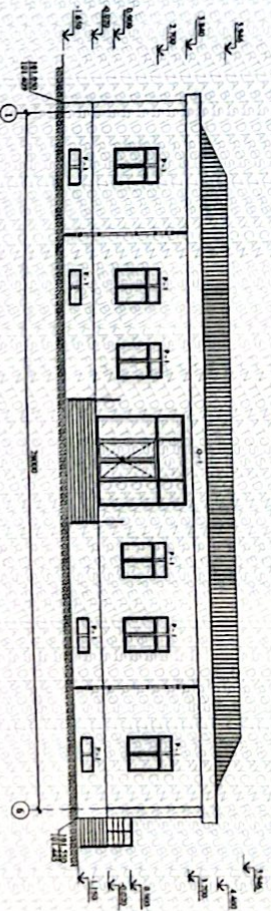

Fasad görünüşü



Nəzərdə buraxılış məntəqəsi

Planda کنار oxlar arasında ölçüləri 3,4x6,4 m olan bina, 1 mərtəbəli, düzbucaqlı formada nəzərdə tutulmuşdur.

Binanın odadavamlılıq dərəcəsi – II, məsuliyyətlik səviyyəsi – II normal, funksional yanğın təhlükəlik sinfi – Q4.3 qəbul edilmişdir.

Divərlər – mişarlanmış əhəngdaşından layihələndirilmişdir.

Dam örtüyü – monolit dəmir-beton tavana üzərində rülön tipli materiallardan qəbul edilmişdir. Fasad divarlarının əsasən suvaq üzrə fasad boyası ilə rənglənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şərti ±0,00 səviyyəsi 101.610 mütləq qiymətinə bərabərdir.

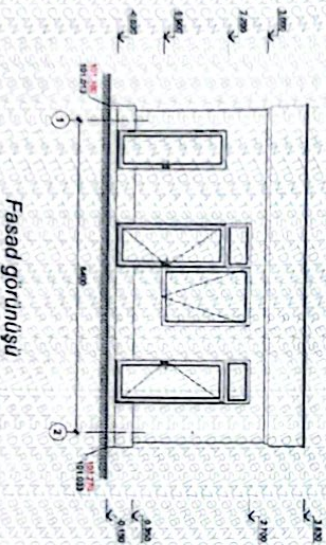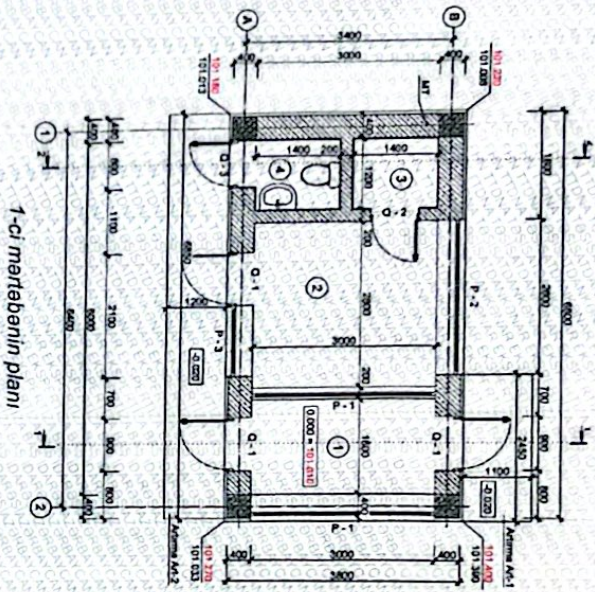

110 kV-luq APQ

Fasad görünüşü

110 kV-luq açıq paylayıcı qurğuya yuva portalları, ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcı və müxtəlif təyinatlı dayaqdaqlar, 110 kV-luq dayaq izolyatoru, metal travertslər, 110 kV-luq 3 qutblu ayrıncı, 10 kV və 35 kV kabel müfəllatları və OPN, idirməölürücü, 110 kV-luq eləqəz açarı üçün dayaq, transformator və dizel generatoru üçün bunövrlər, metal tor hasarlar və s. daxildir.

Kabel quyuları

Qurğuların daxili ölçüləri 1,5x1,5x1,5 (h) və 1,0x1,0x1,0 (h) m olmaqla, dibləri, divarları və örtükleri monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

Nəsoxana

Qurğuların daxili ölçüləri 4,0x4,0x3,34 (h) m olmaqla, dibli, divarları və örtüyü monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

2x54 m³-luq yanğın su anbarları

Qurğuların daxili ölçüləri 4,20x4,20x3,34 (h) m olmaqla, dibləri, divarları və örtükleri monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

50 m³-luq təsərrüfat-icməli su anbarı

Qurğuların daxili ölçüləri 4,20x4,20x3,34 (h) m olmaqla, dibli, divarları və örtüyü monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

30 m³-luq yağdırğan

Qurğuların daxili ölçüləri 3,0x4,0x2,0 (h) m olmaqla, dibli, divarları və örtüyü monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

20 m³-luq yağdırğan

Qurğuların daxili ölçüləri 3,0x4,0x2,0 (h) m olmaqla, dibli, divarları və örtüyü monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

Səmbö

Qurğuların daxili ölçüləri 3,00x5,00x3,40 (h) m olmaqla, dibli, divarları və örtüyü monolit dəmir-betondan, yeraltı qəbul edilmişdir.

Hasar

Metal şəbəkəli daş hasarın uzunluğu L=425,80 m, hündürlüyü H=1,80 m qəbul edilmişdir.

Metal tor hasar (darvaza və alaqapı ilə)

Hasarın ümumi uzunluğu L=243,8 p/m qəbul edilmişdir.

Ekspertizanın aparılma müddətində layihənin baş plan və memarlıq bölməsi üzrə aşağıdakı iradlar müəyyən edilmişdir.

Sıra №	İradın məzmunu	İstinad sənədləri
Baş plan		
1	Baş plan dəsti (Relyefin təşkil planı, Bölüşdürmə planı, Abadlaşdırma planı və Torpaq kütlesinin planı) eləcə də mövqe planı təqdim edilməyib.	AZS QOST 21.508-2010
Memarlıq həlli		
Ümumi idarəetmə mərkəzi (kursülü, 1 mərtəbəli)		
2	Künə ştamları normalara uyğun tərtib edilməyib. Layihə təşkilatının adı, norma kontrolun imzası və sifarişçi qatışmasında memarlıq həlli (MH) yazılmayıb.	AZS GOST 21.101-2010

3	Dəmir konstruktiv qatlarının düyünləri, çatı tirlərinin düzlüyü planı və material sərfi cədvəli təqdim edilməyib.	Vərəq MH - 10
4	Yerləşgəllərin eksplikasiyası cədvəli normalara uyğun tərtib edilməyib.	AZS GOCT 21.101-2010
5	Ümumi göstəricilər vərəqində dam örtüyü 8-ci bənddə cərdəq tipli, 12-ci bənddə isə yastı dam kimi yazılıb.	Vərəq MH - 1
6	İzahat yazısında binanın fasadlarının keramogranit tavalarla üzlənməsi, ümumi göstəricilərdə isə aqlay üzlük tavalarla üzlənməsi və sement-qum məhlulu ilə suvanması qeyd olunur. Düzəliş edilməlidir.	Vərəq MH - 1
Nəzarət-buraxılış məntəqəsi		
- İrad yoxdur.		

Qeyd: - iradlar işçi qaydada aradan qaldırılmışdır;
- statistik qeydiyyat və texniki inventarlaşma məqsədi ilə obyektin sahəsi və digər texniki göstəricilər tikinti başa çatdıqdan sonra dəqiqləşdirilir.


Tikintinin təşkili bölməsi

- İrad yoxdur.

Konstruktiv həll

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Impuls Group" MMC və "Kare Proje Consulting" MMC tərəfindən hazırlanmış memarlıq və konstruksiya bölmələri üzrə layihələrə "Azərdövlətsənayeləyihe" DLI-nun tərtib etdiyi binasının mövcud vəziyyəti haqqında Texnik rəy və S.Ə.Dadaşov adına ETLKİM-in Müayinə Protokolu əsasən aşağıdakılar müəyyənləşdirilmişdir.

Ümumi idarəetmə mərkəzi (İnzibati bina) – planda düzbucaqlı formada, "1-6" və "A-C" oxları arasında 28.00 x 12.80 m ölçüdə, kürsülü + 1 mərtəbəli inşa edilmişdir. Mərtəbə hündürlükləri kürsü mərtəbəsində 2.20 m, 1-ci mərtəbədə 4.00 m-dir. Əsas yükdaşıyan konstruksiyaları monolit dəmir-beton lentvari özüllərdən (h=40 sm), sütunlardan (40x60 sm), rigellərdən (40x50 (h) sm), tirlərdən (25x40 (h) sm), mərtəbəarası və dam örtük tavaqlarından (h=20 sm), əhəngdaşı divar hörgüsündən (t=40 sm) ibarətdir. Dam örtüyü, çərdəq tipli ağac konstruksiyalar üzrə metal kəmərdəndir.



110 kV-luq Açıq Paylayıcı Qurğular (APQ) – 3.407.2-162 və 3.407-108 seriyalı müxtəlif markalı Yuva və Şın portalları, projektor qüllələri, transformatorlar və digər avadanlıqlar altı özüllər və metal dayaq inşaa edilmişdir.

Yeni layihələndirilən **Nəsosxana, Yanğın su anbarı, Təsərrüfat-icməli su anbarı, Yağışan, Şambo** – qurğuların dibləri, divarları və örtük tavaqları müxtəlif ölçülərdə monolit dəmir-betondan layihələndirilmişdir.

Bina və qurğuların layihələndirilməsində aşağıdakı ümumi məlumatlardan istifadə olunmuşdur.

Mühəndisi-geoloji tədqiqatların nəticələrinə görə özlü əsasını şərti hesabı təzyiqi $R_0=2.40 \text{ kq/sm}^2$ olan **bərk konsistensiyalı Gilçə** qurultu təşkil edir. Yeraltı sulara rast gəlinməmişdir. Binanın məsuliyyət dərəcəsi-II-dir.

Dəmir-beton konstruksiyalarda beton B25, armaturlar A500C və A240 sinifli qəbul edilmişdir.

Bina karkasının hesablaması Lira-Sapir proqramında layihələndirmə normalarının tələbləri nəzərə alınmaqla aparılmışdır.

O cümlədən:

- daimi və müvəqqəti faydalı yüklərin normativ qiymətləri - AzDTN 2.1-1 tələbləri üzrə;

- zəlzələ yükləri - AzDTN 2.3-1-ə əsasən sahənin seysmikliyi $S=9_2$ bal, qurultu sinfi G=II qəbul edilmişdir.

Konstruksiya bölməsi

Sıra №	Məzmun	İstinad sənədləri
Ümumi idarəetmə mərkəzi (İnzibati bina)		
1	Bina karkasının fəza hesablamaları (model) təqdim edilməyib.	Hesablama
2	Sm-1 markalı dəmir-beton sütunların armaturlanmasında cizgilərdə 4Ø22 + 8Ø20. Müayinə Protokolu isə 4Ø22 + 4Ø20 armaturlar göstərilmişdir. Habelə, Sm-2 sütunlarda cizgilərdə 4Ø22 + 6Ø18, Müayinə Protokolu isə 4Ø22 + 4Ø18 armaturlar göstərilmişdir. Dəqiqləşdirilməlidir.	Cizgilər, Müayinə Protokolu
110 kV-luq Açıq Paylayıcı Qurğular (APQ)		
3	Qurğu və özüllərin müayinəçi tərəfindən təstiqəlmış cizgiləri təqdim edilsə də müayinə sənədlərində APQ-lar haqqında məlumat verilməmişdir. Aydınlaşdırılmalıdır.	Cizgilər, Texniki Rəy, Müayinə Protokolu
Nəsosxana, Yanğın su anbarı, Təsərrüfat-icməli su anbarı, Yağışan, Şambo, Hasar		
- İrad yoxdur.		
30.07.2025-ci il tarixində işçi qaydada təqdim edilmiş layihə sənədləri üzrə:		
4	2 bəndində göstərilənlər burada təkrarlanır.	
5	3 bəndinə aid təqdim edilmiş "Araş"da "110 kV-luq Açıq Paylayıcı Qurğularının özülləri iki pilləli olmaqla stəkan tiplidir. Həndəsi ölçüləri 1400x1400x400 (birinci pillə), 700x700x1200 mm (ikinci pillə) olmaqla inşa edilmişdir", qeyd olunub.	"Azərdövlətsənayeləyihe" DLI-nun Naxçıvan filialının Memarlıq-inşaat şöbəsinin konstruksiya sektorunun "Araş"ı
6	2 bəndinə aid 12.08.2025-ci il tarixində təqdim edilmiş "Araş"da "Təkrar baxış zamanı müəyyən edildi ki, binanın zirzəmi və 1-ci mərtəbəsində inşa edilmiş monolit dəmir-beton sütun S-1 4(dörd) ədəd diametri 22 mm və 8(səkkiz) ədəd diametri 20 mm olan polad millərlə, sütun S-2 isə 4(dörd) ədəd diametri 22 mm və 6(altı) ədəd diametri 18 mm olan polad millərlə armaturlanmışdır" qeyd edilmişdir.	S.Ə.Dadaşov adına ETLKİM-in 12.08.2025-ci il tarixli "Araş"ı

7	Müayinədə "Binanın yükdaşıyan konstruksiya elementlərində zədələrə müşahidə edilmədiyi" və istifadə olunan betonun və armaturların təqdim edilmiş konstruksiya layihəsinə uyğun olduğu göstərilmişdir.	Texniki rəy, Müayinə Protokolu
8	Bina karkası "Lira SAPR" proqramında işçi qaydada təqdim olunmuş statiki və dinamik fəza hesabı yoxlanılmış, hesabi sxem, yüklər, deformativ göstəricilər Tikinti Norma və Qaydalarının tələblərini ödəyir.	Hesablama

Qeyd: - iradların işçi qaydada aradan qaldırıldığını, habelə müayinə və hesablama nəticələrini (8 və 9 bəndləri) nəzərə alaraq, tikintisi tamamlanmış bina və qurğuların layihələrinin konstruksiya bölməsini qənaətbəxş hesab etmək olar.

Mühəndis-Axtarış Mərkəzinin rəyi

Mühəndisi-geoloji axtarış işlərinin hesabatı "Azərdövlətləyihe" DBLI-nin nəzdində Mühəndis-Axtarış 26.05.2026-cı il tarixli 008/26 nömrəli rəyi ilə təsdiq edilmişdir.

Mühəndisi-kommunikasiya bölmələri:

Su təchizatı və kanalizasiya

Sıra №	İradın məzmunu	İstinad sənədləri
Yarımsansiya binası		
1	Zirzəmiyə enən pilləkənlərdən zirzəmi səviyyəsində yağış suyunun kənarlaşdırılması məqsədi ilə tədbirlər nəzərdə tutulmayıb.	Layihə
NBM		
2	Layihənin işlənməsində Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olmayan normativ sənədlərə istinad edilmişdir.	Layihə
3	Su kəmərinin binaya girişi ilə kanalizasiyanın çıxışı arası məsafə normativə uyğun qəbul edilməyib.	AzDTN 2.11-3, b.5.4.6
Nasosxana		
Təs-icməli su nasoslari: $Q=2 \times 2.5 \text{ m}^3/\text{saat}$, $H=35.0 \text{ m}$, $N=2 \times 0.55 \text{ kvt}$ - 2 ədəd (1 iş., 1 eh.)		
4	Texnoloji boruların bağlanma sxemi plana uyğun verilməyib.	ГОСТ 21.601-2011, n. 7
Təsərrüfat-icməli su anbarı – 50 m³		
5	Nasosların məhsuldarlığına uyğun olaraq, sorma borusunun diametrinə düzəliş edilməlidir.	AzDTN 2.11.-1, b.10.10.
6	Su buraxıcı (boşaltma) boru kəmərinin diametri normativə uyğun seçilməyib.	AzDTN 2.11.-1, b. 12.5.6.
7	İşçi cizgilərə uyğun olaraq material və avadanlıqların təsnifatında düzəliş edilməlidir.	Layihə

Qeyd: - iradlar işçi qaydada aradan qaldırılmışdır;
- xarici, sahədaxili su kəməri və kanalizasiya şəbəkəsinin cizgiləri təqdim edilməyib.

Elektrik təchizatı

Sıra №	İradın məzmunu	İstinad sənədləri
132/110/35/10 kV-luq yarımsansiya binası ($P_n=37,568 \text{ kVt}$)		
1	Elektrik yüklərinin hesabatı normativə uyğun aparılmayıb.	NK 400 nömrəli Qərar
2	Magistral xətlərin en kəsikləri və avtomat açarlarının ayırma cərəyanları elektrik yüklərinə uyğun seçilməyib (BPL).	EQQQ cə.6
3	İşçi cizgilərə uyğun olaraq material və avadanlıqların təsnifatında düzəliş edilməlidir.	Layihə
132/110/35/10 kV-luq "Culfa" YS ($1 \times 50 \text{ MVA} + 2 \times 16 \text{ MVA}$)		
4	Əlavə təqdim edilməlidir: - 110 kV-luq APQ avadanlıqlarının torpaqlanma cizgisi; - yeni quraşdırılan bütün avadanlıqların quraşdırma cizgiləri; - xüsusi sərfiyyat transformatorunun quraşdırma cizgiləri; - yeni quraşdırılan güc transformatorunun quraşdırma cizgiləri.	EQQQ b.1.8.10.; 4.2.2; 4.2.12
5	110 kV-luq APQ-nin kəsilmələrində yüksək gərginlik sıxaqlarının sayına yenidən baxılmalıdır.	EQQQ b.1.6.4
6	Dəyişikliklərə və işçi cizgilərə uyğun təsnifat yenidən işlənilməlidir.	Layihə

Qeyd: - iradlar işçi qaydada aradan qaldırılmışdır.

Nəzarət-buraxılış məntəqəsi ($P_n=6,8 \text{ kVt}$), Nasosxana ($P_n=5,25 \text{ kVt}$)
Baş plan (xarici işıqlanma, $P_{h \text{ işıq}}=3,6 \text{ kVt}$)

- İrad yoxdur.

İsitmə və ventilyasiya Yarımsansiya binası, NBM

- İrad yoxdur.

Qeyd: - Tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl istilik izolyasiya qatının müvafiq qaydada sınaq nəticələri əldə edilməlidir (ГОСТ 17177-94, ГОСТ 30244, ГОСТ 7076-87, ГОСТ 25898-2012, ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84));

- hesabatla müəyyənləşdirilən istilik izolyasiya qatları memarlıq düyünlərində göstərilməlidir;
- hesabatların nəticəsinə əsasən enerji effektivliyi sinfi C – normal təyin olunmuşdur.

Rabitə və siqnalizasiya 132/110/35/10 kV-luq "Culfa" yarımsansiya binası Nəzarət-buraxılış məntəqəsi Yanğın siqnalizasiyası

- İrad yoxdur.

Rəblitə və siqnalizasiya - telefon, kompüter və videonüşəhidə şəbəkələri

- İrad yoxdur.

Baş plan

Videonüşəhidə şəbəkəsi

- İrad yoxdur.

Avtomatik idarəetmə sistemi

- İrad yoxdur.

Qeyd: - xarici rəblitə şəbəkəsinin cizgiləri təqdim edilməyib.

Smeta bölünəsi

Smeta və iş həcmilərinə olan iradlar işçi qaydada aradan qaldırılmışdır.

Nəticə:

«Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, 132110/35/10 kV-luq "Culfa yarımstansiyası"nın resurs mənbəyi ilə tərtib olunmuş yekun smetəyə əsasən ƏDV-si: cəmi - 10494,588 min manat (on milyon dörd yüz doxsan dörd min beş yüz səksən səkkiz manat), o cümlədən TQI - 2379,876 min manat və qayıdılan məbləğ - 13,074 min manat dəyərində olan layihə-smeta sənədləri razılaşdırılır.

İdarənin rəisi müavini:



O.Y. Əfəndiyev

Baş Plan və Memarlıq şöbəsinin müdaxəssisi, şöbə müdiri v.i.e.:



T.Y. Quliyeva

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin müdiri:



B.İ. Hüseynov

Smeta şöbəsinin müdaxəssisi, şöbə müdiri v.i.e.:



T.M. Əfəndiyeva

Baş Plan və Memarlıq şöbəsinin baş müdaxəssisi:



A.Q. Məhərrəmov

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin baş müdaxəssisi:



H.M. Əliyev

Konstruksiya şöbəsinin müdaxəssisi:



N.V. Bağırzadə

Baş Plan və Memarlıq şöbəsinin müdaxəssisi (tikintinin təşkilatçıları üzrə):



N.X. Sevilmiş

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin müdaxəssisi:




F.H. Əliyeva

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin müdaxəssisi:



A.Y. Məxulov

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin müdaxəssisi:




T.İ. Rəhimzadə

Smeta şöbəsinin müdaxəssisi:



G.M. Xanlarova

Mühəndis-kommunikasiya və texnoloji həllər şöbəsinin ştatdankənar müdaxəssisi:



R.H. Əliyev

imza

ci

İmzalı iş
tərtib
ediləri

Tərtib edən: E.A. Hacıyev
